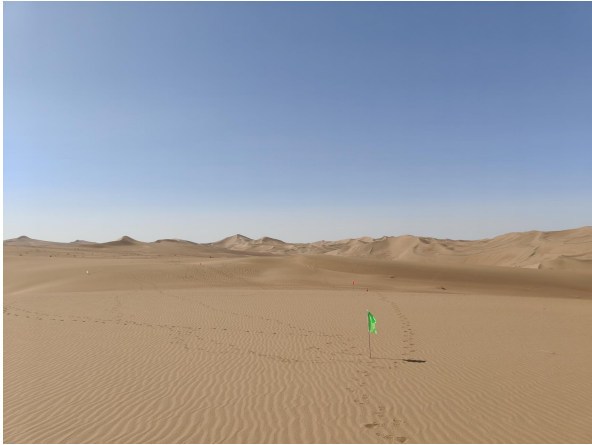
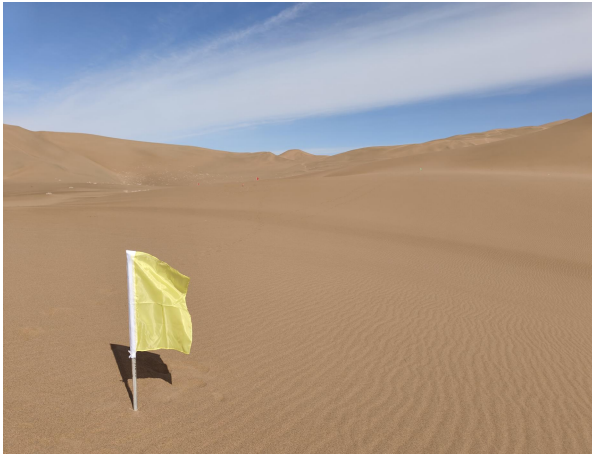


土地复垦方案报告表

项 目 概 况	项目名称	内蒙古自治区额济纳旗温图高勒盐矿普查项目临时用地				
	单位名称	内蒙古博源控股集团有限公司				
	单位地址	额济纳旗				
	法人代表	戴连荣	联系电话	15894986643		
	单位性质	有限责任公司	项目性质	新建		
	项目位置	额济纳旗温图高勒苏木格日勒图嘎查				
	资源储量	(建设项目不填写)	生产能力 (或投资规模)	-		
	划定矿区范围 批复文号	(建设项目不填写)	项目区面积	1.7438hm ²		
	项目位置土地利用 现状图幅号	K48H150001、K48H151001				
	建设期限	2 年	土地复垦方案 服务年限	2 年 1 个月		
方 案 编 制 单 位	编制单位名称	阿拉善盟矿能地理信息勘测规划有限公司				
	法人代表	吴振良				
	资质证书名称	土地规划	资质等级	乙级		
	发证机关	内蒙古自治区土地学会	编号	150012		
	联系人	吴振良	联系方式	04838351978		
	主要编制人员					
	姓名	职务/职称	专业	签名		
	杜轮	工程师	地质工程	杜轮		
	付鹏	助理工程师	土地资源管理	付鹏		
	复 垦 区 土 地 利 用 现 状	土地类型		面积 (hm ²)		
一级地类		二级地类	小计	已损毁	拟损毁	永久占用
未利用地		沙地	1.7438	/	1.7438	/
合计		1.7438	/	1.7438	/	

复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占用 面积	类型		面积（hm ² ）		
			小计	已损毁或占用	拟损毁或占用
	损毁	挖损	0.0900	/	0.0900
		压占	1.6538	/	1.6538
	合计	/	1.7438	/	1.7438
复垦 土地 面积	土地类型		面积（hm ² ）		
	一级地类	二级地类	已复垦		拟复垦
	未利用地	沙地	/		1.7438
	合计		/		1.7438
	土地复垦率（%）		100		
工 作 计 划 及 保 障 措 施	一、编制目的、原则及依据				
	（一）编制目的				
	通过编制土地复垦方案表，贯彻落实“谁损毁、谁复垦”的原则，明确生产建设单位土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，规范额济纳旗各企业临时用地审批程序，确保土地复垦工作落到实处。				
	（二）编制原则				
	此次土地复垦方案报告表的编制，根据当地自然环境与社会经济发展情况，依据国家法律法规及相关政策规定，按照经济可行、技术合理、综合效益最佳和便于操作的要求，结合项目区实际情况进行编制。				
	（三）编制依据				
	a) 法律法规				
	1) 《土地复垦条例实施办法》（中华人民共和国自然资源部令第5号）2019年修正；				
	2) 《土地复垦条例》（国务院第592号令），2011年3月5日；				
	3) 《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日；				
4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订；					
5) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2021年9月1日；					
6) 《中华人民共和国环境保护法》，2014年修订。					
b) 部委规章及规范性文件					
1) 《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发〔2011〕50号文）；					
2) 《关于大力推进节约集约用地制度建设的意见》（国土资发〔2012〕47号）；					
3) 《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》（国土资发〔2008〕176号）；					
4) 《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发〔2007〕81号文）；					
5) 《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号文）。					
c) 技术规范、规程；					

工 作 计 划 及 保 障 措 施	1) 《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017); 2) 《土壤环境监测技术标准》(HJ/T 166-2004); 3) 《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036-2013); 4) 《土地复垦方案编制规程》(TD/T 1031-2011); 5) 内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准(试行)》(内财建〔2013〕600号)。 d) 土地利用相关规划 《额济纳旗旗域空间管制规划图(2015-2030年)》。 (四) 编制目标 通过编制土地复垦方案报告表,明确复垦目标,主要包括:采取预防和控制措施减少的破坏土地面积、土地复垦面积、土地复垦率和其他社会经济生态效益指标。 二、临时用地概况 (一) 项目基本情况 a) 项目名称: 内蒙古自治区额济纳旗温图高勒盐矿普查项目临时用地; b) 地理位置: 额济纳旗温图高勒苏木格日勒图嘎查; c) 建设单位: 内蒙古博源控股集团有限公司; d) 企业性质: 有限责任公司; e) 临时用地服务年限: 2年; f) 建设内容: 井场用地面积 0.7000hm², 主要用途为钻孔、钻井平台、钻探作业区和车辆转运等; 泥浆池用地面积 0.0900hm², 主要用于处理和储存泥浆; 生活区占地面积 0.1400hm², 房屋为彩钢结构; 道路 1 占地面积为 0.0040hm², 路宽 5m, 路长 8m; 道路 2 占地面积为 0.8098hm², 路宽 5m, 路长 1619.6m。 (二) 项目区自然地理概况 a) 地理位置: 项目区位于额济纳旗温图高勒苏木格日勒图嘎查, 中心点地理极值坐标为(2000 国家大地坐标系) 102°00'45", 40°52'14"。 b) 气候: 项目所在地区为典型的中温带大陆性气候, 日照强烈, 气候干燥、多风、少雨, 属于我国极干旱地区。一年四季分明, 年平均气温 6-9℃, 极端最低气温-36.4℃, 极端最高气温 41.6℃。全年降水多集中在 7-9 月, 降雨量平均 100-150mm, 年蒸发量 3000mm 以上。由于干旱少雨, 冬春季西北风盛行, 大风频繁, 最大冻土深度 1.5m, 无霜期天数 114-183 天。 c) 土壤: 项目所在区域分布土壤主要为沙漠风沙土, 土壤有机质含量低, 结构性较差。 d) 植被: 项目区内基本无植被覆盖。 e) 水文: 项目区为沙漠干旱区, 勘察期未见地表水, 地下水位埋藏较深。 (三) 项目区土地利用状况 a) 土地利用状况 根据《内蒙古自治区额济纳旗温图高勒盐矿普查项目临时用地土地勘测定界技术报告书》, 结合额济纳旗第三次国土调查 2023 年度变更调查数据库资料, 确定项目区内土地利用类型和数量, 按照《第三次全国国土调查土地分类》分类标准进行统计。临时用地土地总面积 1.7438hm², 现状地类均为沙地。 b) 土地权属状况 项目区用地权属为额济纳旗温图高勒苏木格日勒图嘎查, 土地性质全部为集体。
---	--

工 作 计 划 及 保 障 措 施	  现场照片 1 现场照片 2   现场照片 3 现场照片 4 三、土地复垦方向可行性分析 （一）土地损毁分析与预测 a) 不同的施工工艺导致对土地损毁形式的不同，本项目对土地的损毁形式为挖损和压占。 挖损主要指钻孔、泥浆池开挖取土损毁了土壤结构，增加了水土流失及养分流失的机会，将会加快水土流失的速度，加剧周边环境的恶化。 压占主要指井场地表建筑、便道被施工车辆及机械碾压地表，改变土壤表层结构，损毁了土地。 b) 根据项目建设中土地损毁的影响因素分析及不同区域土地损毁的特点，土地损毁程度预测单元分为井场、泥浆池、生活区、道路 1、道路 2。 c) 根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）的要求，结合本项工程的具体建设内容，土地损毁程度预测内容包括挖损、压占土地的范围、面积和程度等。在复垦区土地损毁程度评价中按复垦区损毁土地类型来选择主要参评因素。临时土地损毁程度预测等级数确定为 3 级标准。分别定为：轻度损毁、中度损毁、重度损毁。各评价因素的具体等级标准因根据对我区类似项目建设损毁因素的调查统计情况，参考各相关学科的实际经验数据，得出各用地单元损毁土地程度。泥浆池用地单元损毁程度为中度损毁，井场、生活区、道路 1、道路 2 损毁程度为轻度损毁。 c) 本项目复垦区面积即临时用地总面积，复垦责任范围面积为复垦区范围，面积为 1.7438hm²。 （二）土地复垦评价单元及复垦方向
--	---

工 作 计 划 及 保 障 措 施	a) 评价单元是进行土地适宜性评价的基本空间单位。土地适宜性评价结果是通过评价单元土地构成的因素质量评价得出的，因此，评价单元划分对土地评价工作的实施至关重要，直接决定土地评价工作量的大小、评价结果的精度和成果的可应用性。 由于本项目土地复垦适宜性评价的对象为拟损毁的土地，根据土地损毁类型、程度等因素，土地适宜性评价单元划分为 5 个，同上土地损毁程度预测单元。 b) 考虑复垦单元的自然条件、交通条件、所在地的社会因素等，基于优先复垦为原地类和当地群众意愿以及复垦地块后续利用的可行性及与现状条件相符合的综合考虑，尽量复垦为原地类的原则，最终确定复垦方向为沙地。 四、主要复垦措施 (一)土地复垦工程设计 (1) 井场用地面积 0.7000hm²，主要用途为钻孔、钻井平台、钻探作业区和车辆转运等。钻孔利用 425#水泥等材料进行封孔，孔口作永久性标志（埋桩），并注明开孔、钻孔日期、孔号孔深等进行描红（封孔及钻机设备拆除工作由勘探单位负责，本方案中不设计钻孔封闭工程及设备拆除工程）。工程结束后，对井场地表硬化物和砂砾石垫层进行清基、地表清理，清理后的废弃物清运至附近指定垃圾处理站或者填埋场进行处理，最后对井场用地进行平整，平整厚度 0.20m。 (2) 泥浆池用地面积 0.0900hm²，挖深 2.0m，铺设防渗材料，主要用于处理和储存泥浆。工程结束后进行回填，回填土来源为泥浆池开挖堆放于池边的土方量。 (3) 生活区 生活区占地面积为 0.1400hm²，房屋均为单层彩钢结构。项目结束后，利用挖掘机、人工对办公生活区内彩钢结构板房拆除拉运出项目区，项目单位计划再回收利用，故本方案中不统计拆除工程量，只对铺设的砂砾石垫层进行地表清理，清理后的废弃物清运至附近指定垃圾处理站或者填埋场进行处理，之后进行土地平整，平整厚度为 0.2m。 (4) 施工道路 施工道路占地面积为 0.8138hm²，其中道路 1 面积为 0.0040hm²，道路 2 面积为 0.8098hm²。路面铺设 0.3m 的砂砾石垫层，项目结束后，对砂砾石垫层进行地表清理，清理后的废弃物清运至附近指定垃圾处理站或者填埋场进行处理，之后进行土地平整，平整厚度为 0.2m。 (二) 生态恢复措施 临时用地均复垦为沙地，无植被覆盖。因此，不设生物管护措施。 五、土地复垦工程量 (1) 井场 井场用地中钢筋混凝土硬化面积 450m²，清基厚度为 2m，清基工程量为 900m³；砂砾石垫层清理面积为 6550m²，清理厚度为 0.3m，清理工程量为 1965m³；清运工程量为 2865m³；平整面积为 7000m²，平整厚度为 0.2m，平整工作量为 1400m³。 (2) 泥浆池 泥浆池用地面积 0.0900hm²，回填深度 2.0m，边坡为 1:0.5，则回填量为 1680m³； (3) 生活区
---	---

工 作 计 划 及 保 障 措 施	生活区面积为 0.1400hm²，砂砾石清理厚度为 0.3m，清理工程量为 420m³；清运工程量为 420m³；平整厚度为 0.2m，平整工作量为 280m³；
	（4）施工道路
	施工道路面积为 0.8138hm²，砂砾石清理厚度为 0.3m，清理工程量为 2441m³；清运工程量为 2441m³；平整厚度为 0.2m，平整工作量为 1628m³。
	六、复垦计划安排
	本项目总工期包括：建设期 2 年，复垦期 1 个月。因此该项目土地复垦方案表的服务年限从即日起确定为 2 年 1 个月。具体包括：
	建设期：2 年（2025 年 7 月 1 日～2027 年 6 月 30 日）；
	复垦期：1 个月（2027 年 7 月 1 日～2027 年 7 月 31 日）。
	七、保障措施
	（一）组织保障措施
	土地复垦方案报告表评审通过后由建设单位负责组织实施。为保证土地复垦方案报告表的顺利实施，建立强有力的组织机构是十分必要的，组织机构负责土地复垦的委托、报批和方案实施工作，机构的工作职责如下：
	a）认真贯彻、执行“谁损毁、谁复垦”的复垦方针，确保复垦工程安全，充分发挥复垦工程效益。
	b）建立防治目标责任制，把复垦列为工程进度、质量考核的内容之一，制定土地复垦详细实施计划。
	c）生产期间协调好土地复垦与主体工程的关系，确保土地复垦工作的正常施工，并按时竣工最大限度恢复土地使用功能。
	d）深入现场进行检查和观察，掌握土地复垦工程的运行状况及防治措施落实情况。
	e）按照土地复垦条例有关规定，严格实施土地复垦工作。待土地复垦完成后，由自然资源主管部门组织验收。验收合格后，交付原权属单位。
	（二）资金保障措施
	资金保障是贯穿于土地复垦始终的计、提、管、用一体化制度，按照《土地复垦条例》严格将复垦资金存入专用账户，土地复垦账户应按照“企业所有，政府监督，专户专用，专款专用”的原则管理，由自然资源局进行监管建设单位按照土地复垦方案报告表完成土地复垦任务后，向监管部门提出验收申请，验收合格后可向监管部门申请支取预存的土地复垦费用用于土地复垦工程费。
	（三）监管保障措施
	本项目应由额济纳旗自然资源局组织监管，建立专职机构，由专职人员具体管理负责制，制定详细的施工方案，建立质量监测及验收等工作程序土地复垦义务人应自觉地接受自然资源、林草、环保等相关管理部门的监督和检查，义务人应当定期向额济纳旗自然资源局报告土地损毁情况、土地复垦资金使用情况以及土地复垦工程实施情况。资金提取和投入要严格按照方案制定的进度进行，保障复垦资金能够及时到位，保证复垦工程顺利实施，工程竣工后，应及时报请自然资源行政主管部门组织专家验收。
	（四）技术保障措施
	土地复垦工作专业性、技术性较强，需要定期培训技术人员、咨询相关专家开展科学试验、引进先

	进技术以及对土地损毁情况进行动态监测和评价，做到地质勘查绿色环保。																												
	a) 加强向项目区所在地具有复垦经验的单位学习研究，及时吸取经验，完善复垦措施。																												
	b) 根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善土地复垦方案，做到所有复垦工程遵循复垦方案报告表。																												
	c) 严格按照建设工程招标进度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有相关等级的资质。																												
	e) 建设、施工等各项工作严格按照有关规定。																												
投资估算	测算依据	一、土地损毁类型、面积及测算依据 1、土地损毁类型及面积 该项目对土地的损毁为挖损和压占，挖损损毁土地面积为 0.0900hm²；压占损毁土地面积为 1.6538hm²。 2、损毁土地面积的测算 采用多因素综合评价与设计资料统计相结合的方法，确定损毁土地的评价因素，评价出土地损毁程度为中度、轻度，损毁土地面积为 1.7438hm²。 二、复垦土地用途及面积 根据待复垦土地适宜性评价结果，本方案预期复垦土地面积为 1.7438hm²，复垦方向为沙地，土地复垦率达 100.00%。 三、投资估算及测算依据 本项目共复垦土地面积 1.7438hm²，静态投资为 82.16 万元，每公顷投资 47.12 万元（亩均投资 3.14 万元），其中工程施工费 78.31 万元，占总投资的 95.31%；其他费用共计 1.00 万元，占总投资的 1.22%；监测费 0.20 万元，占总投资的 0.24%；不可预见费 2.65 万元，占总投资的 3.23%。价差预备费 2.94 万元，动态投资为 85.10 万元，每公顷投资 48.80 万元（亩均投资 3.25 万元）。 投资估算依据： 1、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）的通知》（内财建〔2013〕600 号）； 2、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建标[2019]113 号）； 3、项目工程设计图及工程量表； 4、阿拉善盟材料价格信息（2025 年 3-4 月）及材料价格市场价。																											
	费用构成	<table><tr><th colspan="3">投资总表</th></tr><tr><th>序号</th><th>工程或费用名称</th><th>费用（万元）</th></tr><tr><td>1</td><td>工程施工费</td><td>78.31</td></tr><tr><td>2</td><td>其他费用</td><td>1.00</td></tr><tr><td>3</td><td>监测费</td><td>0.20</td></tr><tr><td>4</td><td>不可预见费</td><td>2.65</td></tr><tr><td>5</td><td>静态总投资</td><td>82.16</td></tr><tr><td>6</td><td>价差预备费</td><td>2.94</td></tr><tr><td>7</td><td>动态总投资</td><td>85.10</td></tr></table>		投资总表			序号	工程或费用名称	费用（万元）	1	工程施工费	78.31	2	其他费用	1.00	3	监测费	0.20	4	不可预见费	2.65	5	静态总投资	82.16	6	价差预备费	2.94	7	动态总投资
投资总表																													
序号	工程或费用名称	费用（万元）																											
1	工程施工费	78.31																											
2	其他费用	1.00																											
3	监测费	0.20																											
4	不可预见费	2.65																											
5	静态总投资	82.16																											
6	价差预备费	2.94																											
7	动态总投资	85.10																											

投 资 估 算	费 用 构 成	施工费估算表							
		序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价(元)	合计(元)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		1	[40083]	清基	100m³	9.00	56274.66	506471.94	
		2	[20342]	清理	100m³	48.26	2355.08	113656.16	
		3	[20343]	清运	100m³	57.26	2711.94	155285.68	
		4	[10219]	回填	100m³	16.80	153.64	2581.15	
		5	[10219]	平整	100m³	33.08	153.64	5082.41	
		总计	—	—	—	—	—	783077.34	
		其他费用计算表							
		序号		费用名称		计算公式		金额(元)	
		(1)		(2)		(3)		(4)	
		1		前期工作费		市场价格		3000	
		2		工程监理费		市场价格		2000	
		3		竣工验收费		市场价格		2000	
		4		项目管理费		市场价格		2000	
		合计						10000	
		不可预见费计算表							金额单位: 元
		序号	费用名称	工程施工费	设备购置费	其他费用	小计	费率(%)	合计
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1	不可预见费	783077.34	—	10000.00	883077.34	3.00	26492.32
		监测管护费估算表							金额单位: 元
		序号		费用名称		计算公式		预算金额	
		(1)		(2)		(3)		(4)	
		一		监测管护费				2000	
		1		监测费		市场价格		2000	
		2		管护费		植物工程措施*0		0	
		价差预备费计算表							金额单位: 元
		开始第 n 年		静态投资(万元)		价差预备费计算公式		价差预备费(万元)	
		1		33.19		33.19×(1.06 ¹⁻¹ -1)		0.00	
		2		48.97		48.97×(1.06 ²⁻¹ -1)		2.94	
		合计		82.16				2.94	

投 资 估 算	费 用 构 成	单价分析表				
		定额编号：[10219]推土机推土（一二类土，0~10m）				金额单位：元/100m³
		序号	项目名称	单位	数量	单价(元)
		一	直接费			小计（元）
						109.46
		(一)	直接工程费			105.25
		1	人工费			7.96
			乙类工	工日	0.1	79.55
		2	材料费			0.00
		3	机械使用费			92.28
			74kw 推土机	台班	0.14	659.15
		4	其他费用	%	5	100.24
		(二)	措施费	%	4	105.25
		二	间接费	%	5	109.46
		三	利润	%	3	114.93
		四	材料价差			24.61
			柴油	kg	7.48	3.29
		五	未计价材料费			0.00
		六	税金	%	9	118.38
		合计				153.64
		定额编号：[20342]2m³ 装载机装石碴自卸汽车运石碴（运距 0-0.5km）				金额单位：元/100m³
		序号	项目名称	单位	数量	单价
		一	直接费			小计
						1596.67
		(一)	直接工程费			1535.26
		1	人工费			97.71
			甲类工	工日	0.1	102.08
			乙类工	工日	1.1	79.55
		2	机械使用费			1404.50
			装载机 2m³	台班	0.48	930.54
			推土机 74kw	台班	0.22	659.15
			自卸汽车 5t	台班	1.98	410.52
		3	其它费用	%	2.2	1502.21
		(二)	措施费	%	4.0	1535.26
		二	间接费	%	6.0	1596.67
		三	利润	%	3.0	1692.47
		四	材料价差			454.94
			柴油	kg	138.28	3.29
		五	税金	%	9.0	1743.25
		合 计		-	-	2355.08

定额编号: [20343]2m³ 装载机装石碴自卸汽车运石碴

金额单位: 元/100m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1877.05
(一)	直接工程费				1804.86
1	人工费				97.71
	甲类工	工日	0.1	102.08	10.21
	乙类工	工日	1.1	79.55	87.51
2	机械使用费				1668.29
	装载机 2m³	台班	0.48	930.54	446.66
	推土机 74kw	台班	0.22	659.15	145.01
	自卸汽车 10t	台班	1.59	677.12	1076.62
3	其它机械费(按百分比计算)	%	2.2	1766.01	38.85
(二)	措施费	%	4	1804.86	72.19
二	间接费	%	6	1877.05	112.62
三	利润	%	3	1989.68	59.69
四	材料价差				478.14
	柴油	kg	145.33	3.29	478.14
五	税金	%	9	2049.37	184.44
合 计		-	-	-	2711.94

定额编号: [40083]混凝土拆除 (有钢筋, 机械拆除)

金额单位: 元/100m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				47287.17
(一)	直接工程费				45035.40
1	人工费				21160.30
	乙类工	工日	266	79.55	21160.30
2	机械使用费				20156.58
	电动空气压缩机 3m³/min	台班	54.0	185.59	100021.86
	风镐	台班	108.0	93.84	10134.72
3	其它费用	%	9.0	41316.88	3718.52
(二)	措施费	%	5.0	45035.40	2251.77
二	间接费	%	6.0	47287.17	2837.23
三	利润	%	3.0	50124.40	1503.73
五	税金	%	9.0	51628.13	4646.53
合 计		-	-	-	56274.66

		机械台班估算单价计算表						金额单位：元
定额 编号	机械名称 及规格	一类 费用	二 类 费 用					台班费 （元/台 班）
			人工费（元/日）		柴油费（元/kg）		小 计 （元）	
			工日	金额	数量	金额		
1010	装载机 2m³	267.38	2	102.08	102	4.5	663.16	930.54
1014	推土机 74kw	207.49	2	102.08	55	4.5	451.66	659.15
4011	自卸汽车 5t	99.25	1.33	102.08	39	4.5	311.27	410.52
4013	自卸汽车 10t	234.46	2	102.08	53	4.5	442.66	677.12
定额 编号	机械名称 及规格	一类 费用	二 类 费 用					台班费 （元/台 班）
			人工费（元/日）		电（KW.h）		小 计 （元）	
			工日	金额	数量	金额		
6001	电动空气压 缩机 3m³/min	28.92	1	102.08	103	0.53	156.67	185.59
定额 编号	机械名称 及规格	一类 费用	二 类 费 用					台班费 （元/台 班）
			人工费（元/日）		风（m³）		小 计 （元）	
			工日	金额	数量	金额		
1052	风镐	4.24	0	-	320	0.28	89.60	93.84

		主要材料估算价格表				金额单位：元
序号	名称及规格	单位	价格（元）			
			预算价格	限价价格	材料价差	
1	柴油	kg	7.79	4.5	3.29	
2	风	m³	0.28	0	0	
